Reportes al 31 de Diciembre '09

Fase 1 Conversión del Sistema

El proyecto SIePIS continua en su FASE número 1.
Algunas acciones relevantes que se desarrollan en esta fase:
- En esta fase se sigue el sistema actual tal como está y solo se adicionan algunas mejoras.
- Se lleva a cabo la Configuración de Personas.
Este proceso de simplificación permitirá manejar bajo el concepto de "Personas" a todos los Fiados, Obligados solidarios, Beneficiarios, Agentes inmobiliarios, Agentes promotores, Agentes promotores, etc., de manera que donde "Persona" en el sistema, sólo se le da un rol para el crecimiento que se requiera. En el caso de Fiados y Obligados Solidarios, traerá la noticia de que los Estados Financieros y las Garantías se registrarán una sola vez.

AVANCE DEL PROYECTO

Estatus Real al 30 de Diciembre 2009	Estatus Planeado al 30 de Diciembre 2009
54.09%	54.09%

AVANCE CONCLUIDAS, ACTUALES Y FUTURAS

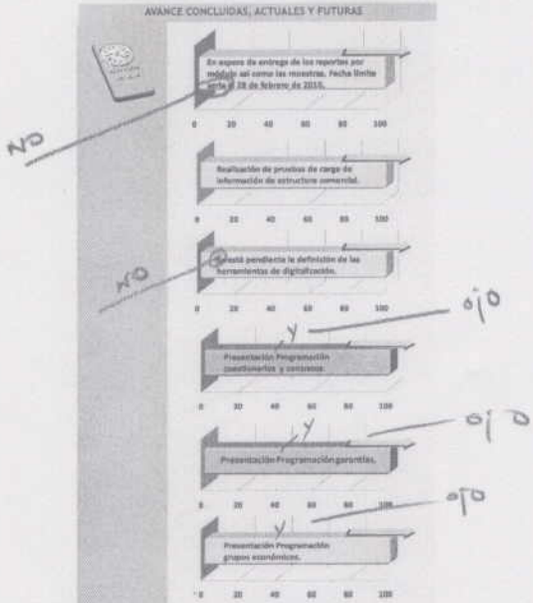



- Selección de herramientas.
- En espera de definición de reportes.
- Carga de Datos. Migración de la información para pruebas, incluido estos programas para alumbrar que SOFASCO haga en la migración final.
- Documentación del Proyecto.

NUEVAS ADICIONES Y MEJORAS AL SISTEMA SIEPIS

Con el objetivo de hacer más completo el proyecto SIePIS, se han identificado varias necesidades en las que se desarrollarán mejoras y adiciones. Estas mejoras requerirán para su desarrollo tiempos adicional al contemplado en el proyecto original.

A continuación se describen las adiciones y optimizaciones que se llevarán a cabo y el tiempo de realización.

Ítem	ADICIONES Y MEJORAS	TIEMPO DE REALIZACIÓN
Nuevo Módulos	1) MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS. En este módulo se podrán dar de alta, modificar, dar baja y bloquear usuarios del sistema, así como también de asignar privilegios para cada uno de los usuarios dentro del sistema. 2) MÓDULO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA CAPTURA DE FORMATOS. El objetivo de este módulo es elevar la calidad de la información. 3) Se recomienda el que una Banca pueda tener más de un Fiado, para evitar el problema de los Cambios del Beneficiario en SIePIS.	12 semanas
Fiadas sin más de un Fiado	El Nuevo Proceso consiste en que puede existir más de un Fiado por Banca. Se tomará en cuenta la Entidad, Tipo de Fiadas, Calificación de Responsabilidad y Administración de Garantías. El beneficio principal de estas características.	12 semanas
Cambios al Diseño	En la versión del diseño se deberán que se visualicen: gráficas y tablas funcionalidades, a lo que se solicita. **Cambios en el Módulo de Avances:** • Que los usuarios no registren información de avances, sino deban avanzar a determinados. • Considerar con N. relación de aplicación en Avances por Fiadas. • Tener el Monto de Avances. **Cambios en el Módulo de Créditos:** • Que no puedan existir montos de Bancos en blanco. • Permitir registrar más de un vigente por Banco y con todo el pago de un crédito, pago de bonos y comisiones. • Cambios en procesos de Fiadores Electrónicos, Distribución, Calificación de Fiadas, Suscripción. **Cambios en el Módulo de Garantías:** • Agregar un nuevo cierre al catálogo de Garantías para que se utilice en todos los reportes. **Cambios en el Módulo de Reaffianzamiento:** • Validar la adecuada razón de avance de cartera para el reafianzamiento Facultativo.	13 semanas
Ampliar Nuevo de Flexibilidad	En el Sistema Actual se desarrollaron programas para la Creación Anuales de Flexibilidad • Fiadas/Bancos • Ramos • Número de Seguros • Número de Fiadas • Mensualidades • Multi-FX (para realizar un solo informe)	5 semanas

AFECTACIONES EN EL CALENDARIO DE REUNIONES CON USUARIOS

El proyecto SIePIS ha sufrido circunstancias que impactan en el tiempo de terminación del mismo, a continuación se describen las causas de las semanas de reuniones con usuarios:

Días de la semana	Motivo	Semanas afectadas
Reuniones con usuarios con usuarios.	a) Semana Santa 2009. b) Semana de Fiestas 2009. c) 3 Semanas de Contingencia por Virus de Influenza. d) 2 Semanas por la presentación de Ventas.	9 semanas

REPROGRAMACIÓN CONCLUSIÓN PROYECTO SIePIS

Con motivo del desarrollo de Nuevas Mejoras y Adiciones al sistema, además de las afectaciones al calendario programado, la fecha de conclusión del Proyecto SIePIS que originalmente era el 26 de Julio de 2010, cambia al 13 de enero de 2011.

NUEVA FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN
13 DE ENERO DE 2011

LOS ADMINISTRADORES DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LA PRESENTE, LOS MANTENIMIENTOS INFORMADOS SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO Y SU APLICACIÓN.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AGENTES GRACIAS.

NO

NO

O|O

Y

O|O

Y

O|O

Y

INFORME 2009.

INFORME. 2010

(3)

(2)

INFORME AL 30 DE DIC 2010

(1)

TÍTULO DEL PROYECTO SIEPIS.
